




PROJEKTOVÝ PLÁN
tvorby Strategie rozvoje
Libereckého kraje
2021+



červen 2018

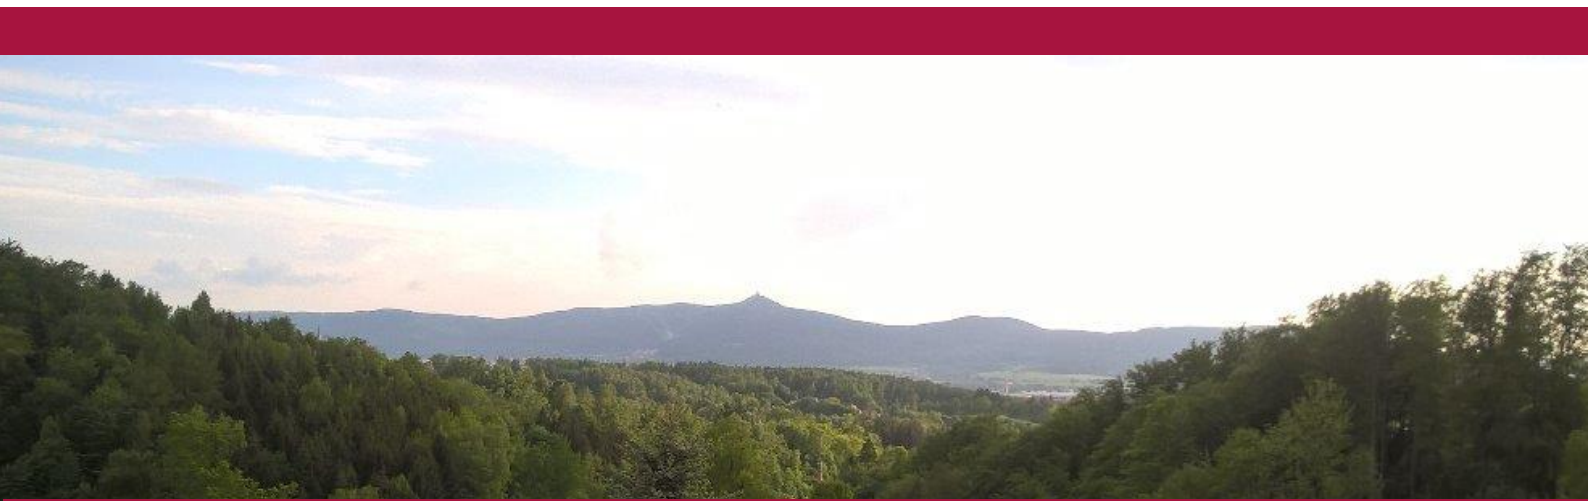

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU



Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+ (dále „SRLK 2021+“) je střednědobý strategický dokument, který na základě znalosti území, společenských podmínek a trendů vývoje na úrovni EU a ČR definuje základní strategické cíle rozvoje území Libereckého kraje a formuluje opatření a aktivity pro jejich dosažení.

SRLK 2021+ je základním strategickým dokumentem, o který se samospráva kraje opírá při rozhodování o vhodnosti záměrů, projektů a aktivit ucházejících o podporu kraje.

SRLK 2021+ je tedy základním vodítkem samosprávy při usměrňování dalšího rozvoje území kraje. Dále na základě uvedených opatření a aktivit v SRLK 2021+ vydává Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen „KÚLK“), konkrétně odbor regionálního rozvoje a evropských projektů (dále jen „ORREP“), tzv. soulady k projektům vyžadujících podporu kraje.


SRLK 2021+ pořizuje samospráva Libereckého kraje, zpracováním je pověřen odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚLK.

Schválení finální verze Programu rozvoje Zastupitelstvem Libereckého kraje se předpokládá na podzim 2020.

Účelem tohoto projektového plánu je stanovení a upřesnění základních postupů a organizace tvorby SRLK 2021+ potřebných pro následné řízení projektu tvorby SRLK 2021+.



ROZSAH A CÍLE PROJEKTU



Potřeba zpracování Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+ vyplývá ze:

ZÁKONA Č. 248/2000 SB. O PODPOŘE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

- *Strategie rozvoje územního obvodu kraje určuje ve stanoveném období zaměření a cíle rozvoje kraje zejména s ohledem na dynamický a vyvážený rozvoj kraje a jednotlivých částí jeho území a stanoví základní podmínky pro naplňování těchto cílů.*
- *Strategie rozvoje územního obvodu kraje zejména*
 - *analyzuje současný stav a očekávaný vývoj územního obvodu kraje,*
 - *stanoví strategické cíle a priority rozvoje kraje a nástroje regionální politiky pro zajištění dynamického a vyváženého rozvoje územního obvodu kraje a částí jeho území,*
 - *vymezuje krajem podporované části jeho území.*
- *Návrh strategie rozvoje územního obvodu kraje se předkládá ke schválení zastupitelstvu kraje se stanoviskem Ministerstva životního prostředí k posouzení vlivu provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a se sdělením, jak bylo toto stanovisko zohledněno.*
- *Pro podklady ke zpracování strategie rozvoje územního obvodu kraje se použije přiměřeně § 7 odst. 2.*
- *V polovině programového období Evropské unie kraj zpracovává zprávu o uplatňování strategie rozvoje územního obvodu kraje, na jejímž základě zastupitelstvo kraje případně rozhodne o aktualizaci strategie rozvoje územního obvodu kraje nebo o zpracování nové strategie rozvoje územního obvodu kraje.*

ZÁKONA Č. 129/2000 SB. O KRAJÍCH

- *Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů, zastupitelstvo kraje koordinuje rozvoj územního obvodu, schvaluje program rozvoje kraje, zajišťuje jeho realizaci a plnění.*

Základním podkladem pro zpracování SRLK 2021+ je **Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020** (dále jen SRLK 2006-2020), což je dlouhodobý strategický dokument kraje, ve kterém je stanovena základní vize, základní strategické cíle a opatření pro rozvoj územního obvodu kraje.

SRLK 2006-2020 byla v roce 2012 aktualizována, projednávána a schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 336/12/ZK. V rámci této aktualizace byla na základě nových informací o území kraje, připomínkování a projednávání na úrovni obcí, ORP a dalších významných subjektů v kraji, ověřena platnost vize Libereckého kraje, strategických cílů a opatření pro nové období 2014-2020 (kompletní dokument lze stáhnout na <http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz>).

Dalším podkladem je v současnosti platný **Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020** a každoroční průběžné monitoringy jeho naplňování.

SRLK 2021+ bude dále vycházet jak z národních (Strategie rozvoje ČR 2021+), tak z evropských rozvojových dokumentů.

V rámci SRLK 2021+ bude vypracována analýza současného stavu a očekávaného vývoje rozvoje Libereckého kraje za využití analýz dalších tematických rozvojových dokumentů kraje a nižších územních celků.

CÍL PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je vytvoření střednědobého strategického dokumentu „Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+“, která:

- respektuje a vychází z priorit národních a evropských strategií pro období 2021+,
- stanoví vizi rozvoje Libereckého kraje a definuje strategické cíle rozvoje Libereckého kraje,
- rozpracovává strategické cíle do opatření a dále až do úrovně jednotlivých aktivit,
- definuje hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje,
- definuje venkovské oblasti Libereckého kraje,
- je zpracováván, konzultován a projednáván ve spolupráci s laickou a odbornou veřejností a stakeholdery v území,
- obsahuje implementační část včetně nástrojů pro naplňování a monitoring programu rozvoje.

ROZSAH PROJEKTU

Na tvorbě programu se budou podílet jednotlivé odbory Krajského úřadu Libereckého kraje prostřednictvím interní pracovní skupiny vytvořené pro tvorbu rozvojových dokumentů – tzv. **PRLK Team**.

Důležitým externím subjektem budou tematické **pracovní skupiny** vytvořené z laické i odborné veřejnosti z území Libereckého kraje. Hlavním úkolem externích pracovních skupin bude pojmenování hlavních problémů rozvoje kraje a spolupráce na vytýčení strategických cílů a návrh konkrétních aktivit pro jejich dosažení v rámci jednotlivých tematických okruhů.

Dalším významným faktorem ovlivňujícím výslednou podobu dokumentu bude proces jeho **projednávání** – ve vybraných komisích rady kraje, ve výborech zastupitelstva kraje, v obcích s rozšířenou působností, oficiální projednávání v rámci procesu SEA, projednávání se sociálními partnery a organizacemi v Libereckém kraji a formou připomínkování dokumentu trvale zveřejněného na webových stránkách KÚLK.

DÉLKA TRVÁNÍ PROJEKTU

Předpokládaný termín ukončení projektu je **září 2020**. Vlastní schválení dokumentu se předpokládá na červenec 2020.

VÝSTUPY PROJEKTU

Výstupem projektu je zpracovaný střednědobý dokument „Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+“, nastavení jeho implementace a monitoringu. Součástí dokumentu je vymezení hospodářsky slabých oblastí a vymezení venkovských oblastí. Dokument bude ve formě tištěné i elektronické, zkrácené verze budou přeloženy do němčiny, angličtiny a polštiny. Dokument bude zároveň zveřejněn na www stránkách Libereckého kraje.

STRUKTURA DOKUMENTU

Předpokládaná struktura dokumentu je navržena takto:

- 1. Úvod**
- 2. Analytická část**
 - a. Zkušenosti s tvorbou Programů rozvoje Libereckého kraje
 - b. Východiska pro tvorbu SRLK 20201+
 - c. Socio-ekonomická analýza
 - d. SWOT Analýza
 - e. Problémová analýza
- 3. Návrhová část**
 - a. Vize, globální a strategické cíle
 - b. Struktura strategických cílů a jejich specifikace do rozvojových opatření
 - c. Strategické cíle a rozvojová opatření (rozpracování)
- 4. Hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti Libereckého kraje**
- 5. Venkovské oblasti Libereckého kraje**
- 6. Implementační část**
 - a. Struktura implementace SRLK 2021+
 - b. Způsob řízení změn
 - c. Monitoring a evaluace
 - d. Finanční zdroje
- 7. Závěr**
- 8. Přílohy**



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA TVORBY SRLK 2021+



Samospráva Libereckého kraje

- Je pořizovatelem Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+.

Rada Libereckého kraje

- Uložila usnesením č. 1177/18/RK úkol zpracovat SRLK 2021+ odboru regionálního rozvoje a evropských projektů.

Zastupitelstvo Libereckého kraje

- Schvaluje program rozvoje územního obvodu kraje dle § 35 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích.

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

- Hlavním gestorem zpracování SRLK 2021+ je odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚLK který byl také garantem zpracování PRLK 2004-2006, PRLK 2007-2013 a PRLK 2014-2020. Uvedený odbor je zároveň hlavním zpracovatelem dokumentu.

Výbor hospodářského a regionálního rozvoje

- Výbor má 15 členů jmenovaných Zastupitelstvem Libereckého kraje. Výbor ve své náplni iniciuje a monitoruje přípravu a zpracování rozhodujících rozvojových dokumentů kraje.
- Výboru bude průběžně podávána informace o průběhu tvorby SRLK 2021+ s možností podání návrhů či připomínek k postupu prací.

Komise Rady LK a Výbory Zastupitelstva LK

- Kompletní materiál bude projednán ve vybraných komisích Rady LK a ve výborech Zastupitelstva LK.
- Jednotlivým výborům a komisím budou předloženy i částečné důležité výstupy (vymezení hospodářsky slabých oblastí, atd.)

PRLK Team

- Pro interní spolupráci s ostatními odbory KÚLK při tvorbě programů rozvoje byl již v roce 2004 vytvořen tzv. PRLK Team – pracovní skupina, ve které jsou zastoupeny všechny odbory KÚLK, jejichž činnost může rozvoj kraje ovlivňovat. Jednotlivé odbory se tak stávají zpracovateli prvních návrhů a garanty za ta opatření, které jim věcně přísluší. Tento přístup se osvědčil při tvorbě strategických dokumentů na předcházející období, a proto je vhodné ho využít i při tvorbě SRLK 2021+.

Pracovní skupiny

- Část podkladů pro tvorbu nové SRLK 2021+ bude vytvářeno ve spolupráci tematickými pracovními skupinami, složenými jak ze zástupců PRLK Teamu, tak odborné veřejnosti.
- Jednání skupin se budou konat odděleně dle časových možností členů, v předpokládaném počtu 3 workshopů (definování problémů v území v rámci tvorby problémové analýzy, tvorba vize a definování cílů v jednotlivých tematických opatřeních).

- Práce ve skupinách bude řízena vybranou firmou specializovanou na facilitace a jednání v pracovních skupinách s využitím moderních technik a metod tak, aby činnost pracovních skupin byla efektivní, přínosná pro zúčastněné osoby a dospěla k jednoznačnému výstupu.
- Výstupy všech skupin zapracuje ORREP do nové verze SRLK 2021+.
- Členové pracovních skupin budou mít možnost po celou dobu tvorby dokumentu připomínkovat jednotlivé části a účastnit se projednávání.


Externí dodavatelé

Externí dodavatelé budou vybráni pro zajištění:

- zpracování vyhodnocení vlivů koncepce Strategie rozvoje Libereckého kraje 2020+ na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (tzv. SEA)
- facilitace jednání tematických pracovních skupin
- dodávka občerstvení pro jednání tematických pracovních skupin
- drobné pozornosti pro členy tematických skupin za jejich účast
- oponentní posudek k PRLK 2014-2020
- tisk SRLK 2021+ a výroba CD
- překlady SRLK 2021+ do anglického, polského a německého jazyka
- propagace (inzerce v novinách, tisk letáků...)

Stejně jako v případě tvorby strategických dokumentů rozvoje v minulých obdobích je nezbytné zapojit do tvorby SRLK 2021+ odbornou veřejnost a vybrané subjekty a osobnosti v kraji. V roce 2011 vstoupil Liberecký kraj do Národní sítě zdravých měst, čímž se jasně přihlásil k prosazování a uplatňování principů MA 21 - zapojení veřejnosti, transparentnost, srozumitelnost, proveditelnost, atd. Ve spolupráci s PRLK Teamem bude vytvořena databáze kontaktů subjektů, které mají vliv na rozvoj Libereckého kraje, dále budou osloveny všechny obce a města Libereckého kraje a zapojena široká veřejnost pomocí médií (www, tisk atd.).

Název role	Popis rolí, pravomocí a odpovědností	
Zadavatel SRLK 2021+	- pověřuje gestora tvorbou SRLK 2021+, - je pravidelně informován o průběhu tvorby SRLK 2021+ - schvaluje zpracovanou SRLK 2021+	<i>Rada a Zastupitelstvo Libereckého kraje</i>
Řídící výbor pro tvorbu SRLK 2021+	- schvaluje a připomínkuje dílčí výstupy SRLK 2021+ v průběhu tvorby dokumentu - je pravidelně informován o průběhu projektu tvorby strategie, jeho výstupech, přínosech, rizicích a změnách	<i>Výbor hospodářského a regionálního rozvoje ZK LK</i>
Gestor tvorby SRLK 2021+	- zodpovídá za tvorbu SRLK 2021+ - zajišťuje financování tvorby SRLK 2021+ - organizuje a připravuje podklady pro jednání Řídícího výboru ve věci tvorby SRLK 2021+ - odpovídá za předložení SRLK 2021+ ke schválení Radě a Zastupitelstvu LK	<i>ORREP – Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů</i>
Koordinátor tvorby SRLK 2021+	- organizuje a řídí práci PRLK Teamu a pracovních skupin - odpovídá za externí obsazení organizační struktury - odpovídá za vytvoření projektového plánu - odpovídá za řízení projektu tvorby SRLK 2021+ a realizaci aktivit dle projektového plánu - odpovídá za zpracování jednotlivých částí SRLK 2021+ - dohlíží na správnou návaznost činností a efektivní řízení zdrojů - vede tým pro tvorbu SRLK 2021+ - koordinuje a řídí činnost pracovních skupin	<i>RNDr. Ivana Pecháčková, vedoucí oddělení koncepcí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů</i>
Tým pro tvorbu SRLK 2021+	provádí jednotlivé aktivity podle projektového plánu	<i>Oddělení rozvojových koncepcí</i>
PRLK Team	- je interní pracovní skupinou složenou ze zástupců odborů KÚLK - podílí se na tvorbě jednotlivých částí SRLK 2021+ - je pravidelně informován o průběhu tvorby SRLK 2021+	
Tematické pracovní skupiny	- složeny ze zástupců KÚLK a odborné a laické veřejnosti - podílí se na tvorbě SRLK 2021+ dle projektového plánu	<i>Tematické pracovní skupiny</i>



POSTUPY ŘÍZENÍ TVORBY SRLK 2021+



Program rozvoje Libereckého kraje schvaluje Zastupitelstvo LK.

Gestorem tvorby SRLK 2021+ byl pověřen odbor regionálního rozvoje a evropských projektů.

Koordinátorem tvorby SRLK 2021+ je RNDr. Ivana Pecháčková, vedoucí oddělení rozvojových koncepcí.


Dílčí výstupy jsou předkládány Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva LK a jsou konzultovány v rámci PRLK Teamu.

Vlastní tvorba dokumentu probíhá pomocí týmu pro tvorbu SRLK 2021+ (oddělení rozvojových koncepcí), v rámci PRLK Teamu a v rámci jednání pracovních skupin.

Koordinace aktivit dodavatelských subjektů má na starosti:

<i>Dodavatel</i>	<i>Osoba zodpovědná za průběh zakázky</i>
Facilitace jednání tematických pracovních skupin	<i>Ing. Lukáš Chmel</i>
Dodavatel občerstvení na jednání tematických pracovních skupin	<i>Ing. Lukáš Chmel</i>
Dodavatel propagace v tiskovinách	<i>Mgr. Zuzana Šiftová</i>
Dodavatel drobných pozorností pro členy tematických pracovních skupin	<i>Ing. Lukáš Chmel</i>
Zpracovatel SEA	<i>Ing. Lukáš Chmel</i>
Dodavatel oponentského posudku	<i>Ing. Lukáš Chmel</i>
Dodavatel tisku	<i>Mgr. Zuzana Šiftová</i>
Dodavatel překladů do angličtiny, polštiny a němčiny	<i>Mgr. Zuzana Šiftová</i>

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA TVORBY SRLK 2021+

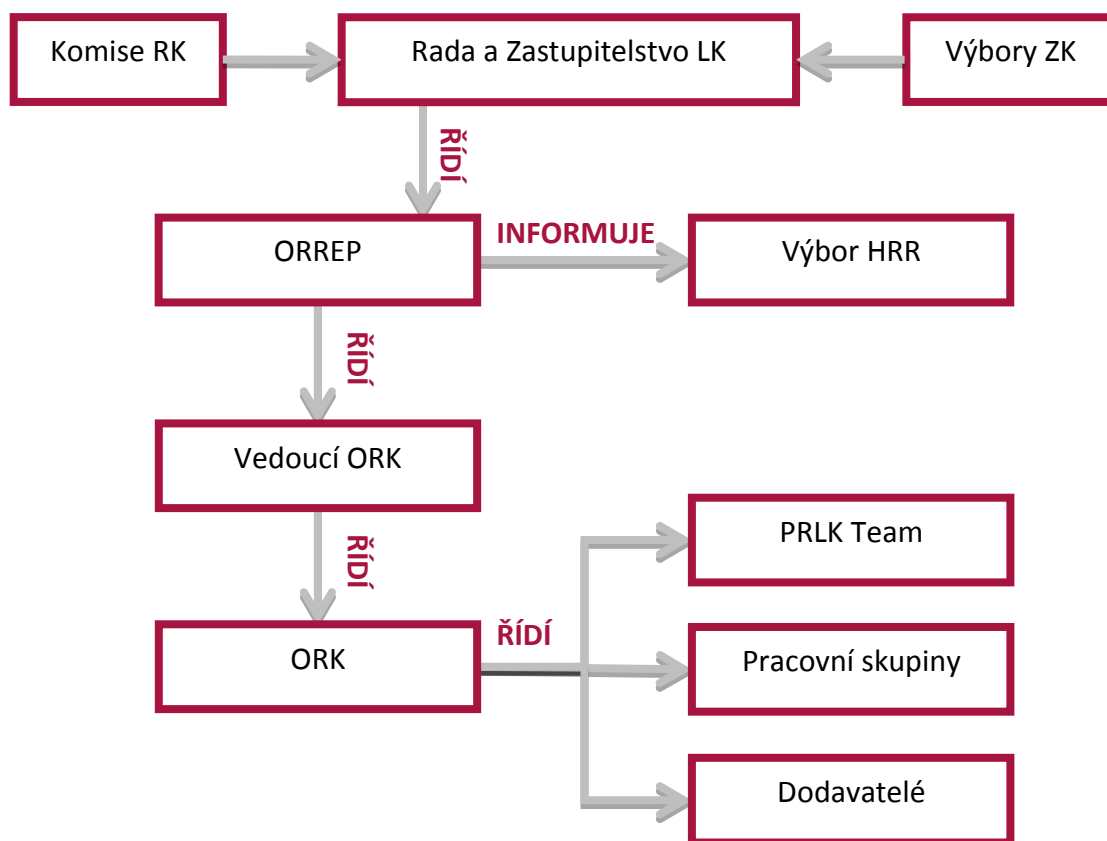

Následující tabulka ukazuje jednotlivé aktivity projektu a odpovědnosti a spolupráce jednotlivých subjektů, které se na tvorbě SRLK 2021+ podílí.

V tabulce jsou jednotlivé subjekty označeny:

- V** ... vykonává
- O** ... odpovídá
- S** ... spolupracuje
- I** ... je informován

NÁZEV	INTERNÍ SUBJEKTY									EXTERNÍ SUBJEKTY			
	ZASTUPITELSTVO LK	RADA LK	VÝBOR HRR	VÝBORY ZK A KOMISE RK	ODBORY KÚ LK (PRLK TEAM)	ORREP (ORK)	TEMATICKÉ PRACOVNÍ SKUPINY	DODAVATEL SEA	DODAVATEL FACILITAČNÍCH SLUŽEB	OSTATNÍ DODAVATELÉ	MĚSTA, OBCE, SDRUŽENÍ OBCÍ	SUBJEKTY Z DATABÁZE KONTAKTŮ	VEŘEJNOST
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PROJEKTU													
Vypracování projektového plánu tvorby SRLK 2021+		I	I		I	VO							
Vytvoření www prezentace projektu		I	I		I	VO					I	I	I
Výběrová řízení na dodávku služeb ohledně pracovních skupin						VO			S	S			
Vytvoření tematických pracovních skupin					S	VO	S				S	S	S
Vytvoření podkladů pro jednání pracovních skupin						VO			S				
Úvodní setkání všech pracovních skupin			I			VO	S	I	V	S			
ANALYTICKÁ ČÁST SRLK 2021+													
Východiska tvorby SRLK						VO							
Socio-ekonomická analýza					S	VO							
SWOT Analýza					S	VO							
1. workshop pracovních skupin – Problémová analýza					S	VO	S	I	V	S			
Projednání a připomínkový proces k analytické části SRLK 2021+			S		S	VO	S				S	S	S
NÁVRHOVÁ ČÁST SRLK 2021+													
Vytvoření návrhové části SRLK 2021+ – Cíle a opatření													
Vize, Cíle, Opatření					S	VO							
2. workshop - Spolupráce a vize					S	VO	S	I	V	S			
3. workshop - Cíle a aktivity					S	VO	S	I	V	S			
Kompletace návrhové části SRLK – Cíle a opatření					S	VO							
Stanovení hospodářsky slabých oblastí (HSO)													
Aktualizace metodiky pro stanovení výpočtu HSO			I			VO							
Výpočet a stanovení HSO			I			VO							
Projednání a připomínkování vymezení HSO			I		S	VO					S		
Výpočet a stanovení venkovských oblastí (VO)													
Aktualizace metodiky pro stanovení výpočtu VO			I			VO							
Stanovení VO						VO							
SEA													
Výběrová řízení na SEA						VO		S					
Zpracování SEA						O		V					I
VYTVOŘENÍ IMPLEMENTAČNÍ ČÁSTI SRLK 2021+													
Nastavení plánu implementace						VO							
Pracovní skupina pro implementaci SRLK 2021+					S	VO							
Nastavení řídicí struktury implementace SRLK 2021+						VO							
Nastavení plánu řízení změn						VO							

Nastavení systému monitorování naplňování cílů SRLK 2021+					S	VO							
Nastavení metodiky akčního plánu						VO							
Kompletace implementační části					S	VO							
SCHVALOVÁNÍ A PROCES PŘIPOMÍNKOVÁNÍ SRLK 2021+													
Připomínkování SRLK 2021+													
Závěrečné setkání všech pracovních skupin					I	VO	I		V				
Interní připomínkování			S	S	S	VO							
Zpracování oponentského posudku						O				V			
Externí připomínkování						VO	S				S	S	S
Schválení SRLK 2021+	S	S	S	S		VO							
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE PROJEKTU													
Tisk						VO				V			
Distribuce		I	I	I		VO	I				I	I	I



HIERARCHICKÁ STRUKTURA TVORBY SRLK 2021+



V této kapitole jsou blíže popsány jednotlivé aktivity, které vedou k dosažení hlavního cíle projektu a jejich výstupy.

NÁZEV AKTIVITY	POPIS AKTIVITY	VÝSTUPY
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PROJEKTU		
Vypracování projektového plánu tvorby SRLK 2021+ <i>Vypracování projektového plánu tvorby SRLK 2021+</i> <i>Projednání projektového plánu v Radě LK</i>	V rámci projektu bude vytvořen projektový plán tvorby SRLK 2021+	zpracovaný dokument Projektový plán
Vytvoření www prezentace projektu <i>zprovoznění sekce na www.kraj-lbc.cz</i> <i>vytvoření banneru na hlavních stránkách LK</i>	Vytvoření www stránek projektu jako hlavního informačního uzlu k předávání informací o projektu a sloužícího ke komunikaci v rámci tematických pracovních skupin...	spuštěné www stránky SRLK 2021+ na internetu
Výběrová řízení na dodávku služeb ohledně pracovních skupin <i>Realizace výběrového řízení na dodavatele facilitačních služeb</i> <i>Realizace výběrového řízení na dodavatele propagačních předmětů</i>	V rámci této aktivity proběhne výběrové řízení na dodavatele facilitačních služeb a na dodavatele propagačních předmětů	podepsaná smlouva s dodavatelem facilitačních služeb, dodané drobné pozornosti pro členy pracovních skupin
Vytvoření tematických pracovních skupin <i>Vytvoření databáze kontaktů pro oslovení členů pracovních skupin</i> <i>Vytvoření formuláře pro přihlášení členů pracovních skupin</i> <i>Oslovení potencionálních členů pracovních skupin</i> <i>Stanovení pracovních skupin a jmenování členů</i>	a vytvoření tematických pracovních skupin. Bude oslovena široká laická i odborná veřejnost, která bude mít možnost přihlásit se pomocí www formuláře k účasti v tematických pracovních skupinách.	vytvořená databáze kontaktů, spuštěný formulář pro přihlášení členů pracovních skupin na internetu, ustanovené pracovní skupiny,
Vytvoření podkladů pro jednání pracovních skupin <i>Stanovení výstupů jednání pracovních skupin</i> <i>Vytvoření harmonogramu jednání pracovních skupin</i> <i>Stanovení průběhu jednání pracovní skupiny</i> <i>Vytvoření podkladů pro jednání pracovních skupin</i>	Na základě konzultací s facilitátorem pracovních skupin bude upřesněn průběh a výstupy z jednání jednotlivých pracovních skupin, bude vytvořen harmonogram jednotlivých jednání včetně organizačního zajištění a budou vytvořeny podklady pro jednotlivá jednání	existence dokumentu popisující formu zápisů z jednání PS, formy finálních výstupů, stanovující průběh jednotlivých jednání PS, existence seznamu potřebných podkladů pro jednání PS

Úvodní setkání všech pracovních skupin	Na úvodní setkání budou pozváni členové všech pracovních skupin. Půjde hlavně o seznámení se s projektem a s požadovanými výstupy z jednání pracovních skupin. Podrobný předpokládaný průběh jednání je znám z předchozí aktivity.	existující zápis z jednání
<i>Organizační zajištění společného jednání</i>		
<i>Příprava podkladů pro jednání</i>		
<i>Realizace úvodního jednání pracovních skupin</i>		
ANALYTICKÁ ČÁST SRLK 2021+		
Východiska tvorby SRLK	Příprava podkladů pro zpracování analytické části, zmapování potřebných zdrojů informací.	existující podklady pro zpracování analytické části
<i>Analýza dokumentů rozvoje na úrovni ČR a EU</i>		
<i>Analýza strategií místních akčních skupin LK</i>		
<i>Přehled krajských tematických dokumentů</i>		
<i>Analýza projektových záměrů z RAP do území LK</i>	Vytvoření socio-ekonomické analýzy Libereckého kraje s důrazem na předem stanovené tematické oblasti, případně včetně analýzy cílových skupin	existující S-E Analýza
Socio-ekonomická analýza		
<i>Stanovení oblastí S-E Analýzy</i>		
<i>Sběr a analýza dat</i>		
<i>Vytvoření S-E Analýzy</i>	Vytvoření SWOT Analýz na základě socio-ekonomické analýzy a definování hlavních problémů a oblastí rozvoje LK jako podkladu pro jednání pracovních skupin.	existující SWOT Analýzy
SWOT Analýza		
<i>Vytvoření SWOT Analýz dle hlavních tematických oblastí</i>		
<i>Vytvoření souhrnné SWOT Analýzy a definování hlavních problémů a oblastí rozvoje LK</i>	1. pracovní jednání všech skupin, výsledkem by mělo být uvedení do problematiky a konzultace problémových oblastí vzešlých z předchozích analýz.	existující zápisy z jednání
1. workshop pracovních skupin – Problémová analýza		
<i>Organizační zajištění jednání pracovních skupin</i>		
<i>Příprava podkladů pro jednání</i>		
<i>Jednání pracovních skupin – definování problémových oblastí LK</i>		
<i>Vyhodnocení závěrů jednání pracovních skupin</i>		
<i>Vytvoření problémové analýzy</i>		


Projednání a připomínkový proces k analytické části SRLK 2021+		
<i>Kompletace jednotlivých kapitol analytické části SRLK 2021+</i>		
<i>Interní a externí připomínkování zainteresovanými stranami</i>		
<i>Zpracování připomínek</i>		
NÁVRHOVÁ ČÁST SRLK 2021+		
Vytvoření návrhové části SRLK 2021+ – Cíle a opatření		
<i>Vize, Cíle, Opatření</i>		
<i>Definování vize, strategických cílů a opatření</i>		
2. workshop - Spolupráce a vize		
<i>Organizační zajištění jednání pracovních skupin</i>		
<i>Příprava podkladů pro jednání</i>	2. pracovní jednání všech skupin, výsledkem by mělo být formulování vize a uvedení do problematiky.	existující zápis z jednání
<i>Jednání pracovních skupin - stanovení vize opatření</i>		
<i>Vyhodnocení závěrů jednání pracovních skupin</i>		
3. workshop - Cíle a aktivity		
<i>Organizační zajištění jednání pracovních skupin</i>		
<i>Příprava podkladů pro jednání</i>	3. pracovní setkání všech skupin, výsledkem by mělo být naformulování cílů a aktivit k jejich dosažení	existující zápis z jednání
<i>Jednání pracovních skupin - cílů a aktivit opatření</i>		
<i>Vyhodnocení závěrů jednání pracovních skupin</i>		
Kompletace návrhové části SRLK 2021+ – Cíle a opatření		
<i>Zpracování výstupů z jednání pracovních skupin</i>	Zpracování výstupů z jednotlivých jednání a vytvoření návrhové části z informací ze všech jednání PS (vytvoří dodavatel facilitace), konzultace s odbory a vytvoření pracovní verze návrhové části (tematické)	vytvořená pracovní verze návrhové části SRLK 2021+ - cíle a opatření
<i>Konzultace výstupů s odbory KÚLK skrze PRLK Team</i>		

Stanovení hospodářsky slabých oblastí		
Aktualizace metodiky pro stanovení výpočtu HSO	Stanovení základních ukazatelů pro výpočet HSO, stanovení základních územních jednotek (generelové jednotky) určených pro sledování HSO a projednání této metodiky se zainteresovanými stranami (TUL, obce, atd.)	existence mapového podkladu stanovujícího generelové jednotky na území LK, existující metodika pro výpočet HSO (stanovené indikátory a jejich váhy)
<i>stanovení základních ukazatelů pro výpočet HSO</i>		
<i>projednání se zainteresovanými stranami</i>		
Výpočet a stanovení HSO	Vlastní výpočet HSO a vytvoření mapových podkladů	existující pracovní verze dokumentu vymezení HSO na území LK
<i>sběr a analýza podkladů pro výpočet HSO</i>		
<i>výpočet a stanovení HSO</i>		
Projednání a připomínkování stanovení HSO	Samostatné projednání HSO ve výboru HRR a se zainteresovanými stranami	existence připomínkového archu obsahujícího připomínky k vymezení HSO
<i>projednání na výboru HRR a se zainteresovanými stranami</i>		
<i>zpracování připomínek</i>		existující finální verze vymezení HSO
Výpočet a stanovení venkovských oblastí (VO)		
Aktualizace metodiky pro stanovení výpočtu VO	V rámci této aktivity proběhne výběrové řízení na dodavatele metodiky pro stanovení venkovských oblastí a typologie venkova na území LK a její následné projednání se zainteresovanými stranami	vytvořená metodika pro vymezení venkova
<i>aktualizace metodiky a stanovení indikátorů a jejich vah pro výpočet</i>		
<i>projednání se zainteresovanými stranami</i>		
Stanovení VO	Dodavatel vymezí venkovské oblasti a jejich typologii na území LK	dokument obsahující vlastní vymezení venkovských oblastí v LK
<i>výpočet a stanovení VO</i>		
SEA		
Výběrová řízení na SEA	V rámci této aktivity proběhne výběrové řízení na dodavatele zpracování SEA včetně zpracování oznámení	podpis smlouvy s dodavatelem, oznámení koncepce podané na MŽP, existující dokument - pracovní verze SEA
<i>realizace výběrového řízení na dodavatele zpracování SEA</i>		

Zpracování SEA	Výběr dodavatele a zpracování SEA. Proběhne připomínkování dle zákona 100/2001 Sb.	podepsaná smlouva s dodavatelem, dokument SEA k SRLK 2021+, vydané stanovisko MŽP ke koncepci
<i>zpracování oznámení koncepce</i>		
<i>zpracování posuzování vlivu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví</i>		
<i>Veřejné projednání dle zákona 100/2001 Sb.</i>		
<i>zpracování připomínek a kompletace SEA</i>		
VYTVOŘENÍ IMPLEMENTAČNÍ ČÁSTI SRLK 2021+		
Nastavení plánu implementace		
Pracovní skupina pro implementaci SRLK 2021+	V rámci této aktivity bude vytvořena pracovní skupina pro implementaci SRLK2021+, která se bude zabývat tvorbou implementační části SRLK 2021+ a jejím připomínkováním. Případně bude pro tuto aktivitu využito PRLK Teamu.	vytvořená pracovní skupina pro implementaci, existující zápis z jednání pracovní skupiny
<i>Oslovení potencionálních členů pracovní skupiny</i>		
<i>Vytvoření pracovní skupiny</i>		
<i>Jednání pracovní skupiny k implementační části</i>		
Nastavení řídicí struktury implementace SRLK 2021+	V rámci této aktivity budou určeni gestoři za jednotlivá opatření, určeny hlavní nástroje implementace SRLK 2021+	vytvořena kapitola Struktura implementace SRLK 2021+
<i>Nastavení rolí a odpovědností jednotlivých subjektů zapojených do implementace SRLK 2021+</i>		
<i>Stanovení pravidel a procesů řízení implementace SRLK 2021+</i>		
Nastavení plánu řízení změn	V rámci této aktivity bude určen způsob a možnosti změn jednotlivých opatření a aktivit, definována situace kdy k takovýmto změnám může dojít	vytvořena kapitola Metodika řízení změn
<i>Nastavení způsobu identifikace potřeby realizace změn</i>		
<i>Nastavení způsobu projednání a schválení navrhovaných změn</i>		
Nastavení systému monitorování naplňování cílů SRLK 2021+	Nastavení monitoringu, sběru a vyhodnocování dat, vytvoření nového databázového systému, atd. Nastavení vyhodnocování nakládání s veřejnými prostředky, vyhodnocení finančních prostředků z EU, SR a rozpočtu LK	vytvořena kapitola Metodika monitoringu, databázový systém, vytvořena kapitola Metodika evaluace
<i>Identifikace potřebných dat</i>		
<i>Stanovení frekvence sběru dat</i>		
<i>Nastavení systému monitorování a vyhodnocování cílů SRLK 2021+</i>		
<i>Nastavení plánu evaluací SRLK 2021+</i>		

Nastavení metodiky akčního plánu	Nastavení struktury akčního plánu, navazujícího na SRLK 2021+, určení zdrojů pro implementaci SRLK 2021+, atd.	vytvořena kapitola Metodika tvorby akčního plánu
Vytvoření metodiky akčního plánu		
Kompletace implementační části	kompletace implementační části	existující pracovní verze implementační části
Kompletace implementační části		
SCHVALOVÁNÍ A PROCES PŘIPOMÍNKOVÁNÍ SRLK 2021+		
Připomínkování SRLK 2021+		
Závěrečné setkání všech pracovních skupin	Závěrečná konference, které by se měli účastnit členové všech pracovních skupin, seznámení s výsledky jednání PS, projednání, kulaté stoly, atd. Bude představena pracovní verze SRLK 2021+.	existující zápis z jednání
Organizační zajištění společného jednání		
Příprava podkladů pro jednání		
Interní připomínkování	Připomínkování SRLK 2021+ v rámci krajského úřadu	existující připomínky z KÚLK, vytvořená 1. pracovní verze SRLK 2021+
Projednání v rámci PRLK Teamu		
Projednání na výborech ZK		
Vypořádání připomínek a případně úprava SRLK 2021+		
Zpracování oponentského posudku	Vytvoření oponentského posudku odborníkem a zpracování případných připomínek do SRLK 2021+. V rámci oponentského posudku by mělo dojít i na vazbu na územně plánovací dokumentaci na úrovni kraje.	podepsaná smlouva s dodavatelem, vytvořený oponentský posudek, 2. pracovní verze SRLK 2021+
Výběr dodavatele na zpracování oponentského posudku		
Vypracování oponentského posudku		
Zpracování připomínek a případně úprava SRLK 2021+		
Externí připomínkování	Připomínkování SRLK 2021+ na veřejných projednáních, výzvy k připomínkování na www, e-mailem zainteresovaným stranám, v tisku, atd.	sesbírané připomínky externích subjektů, vytvořena 3. pracovní verze SRLK 2021+
Vytvoření formuláře pro získávání připomínek včetně formuláře na www stránkách		
Veřejné projednání v rámci všech ORP včetně SEA (10 jednání)		
Získání připomínek od externích subjektů, členů pracovních skupin a veřejnosti k připomínkování (www, články, e-maily, atd.)		
Vypořádání připomínek a případně úprava SRLK 2021+		

Schválení SRLK 20201+		
Schválení RK	Schválení SRLK 2021+ orgány Libereckého kraje	Usnesení RK a ZK, existence schválené finální verze SRLK 2021+
Projednání na výborech ZK		
Schválení ZK		
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE PROJEKTU		
Tisk	V rámci této aktivity budou vytvořeny vícejazyčné zkrácené verze SRLK 2021+obsahující CD s kompletním zněním dokumentu, dokument bude zveřejněn na www stránkách kraje, bude vytvořen leták informující o SRLK 2021+	podepsané smlouvy s dodavateli, existence tištěné zkrácená verze SRLK 2021+ (česky, polsky, anglicky a německy), CD a letáku k SRLK 2021+
Realizace výběrového řízení na dodavatele tiskových služeb		
Realizace výběrového řízení na překlad zkrácených verzí SRLK 2021+		
Tisk zkrácené verze SRLK 2021+		
Tisk CD		
Tisk letáku k SRLK 2021+		
Distribuce	Distribuce tištěných verzí vybraným subjektům, odborům KÚLK, samosprávě atd., zveřejnění na www stránkách LK	Zveřejnění nového SRLK 2021+ na webu, předání na obce a dalším vybraným subjektům



HARMONOGRAM TVORBY SRLK 2021+



SRLK 2021+ by měl být dokončen, projednán a schválen samosprávou kraje do konce října roku 2020.

[illegible]

ABC

SEZNAM ZKRATEK



ČR	Česká republika
EU	Evropská unie
HSO	hospodářsky slabé oblasti
KÚLK	Krajský úřad Libereckého kraje
LK	Liberecký kraj
MA 21	místní Agenda 21
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
ORK	oddělení rozvojových koncepcí
ORP	obec s rozšířenou působností
ORREP	odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
PRLK	Program rozvoje Libereckého kraje
RK	rada kraje
SEA	posuzování vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví
SRLK	Strategie rozvoje Libereckého kraje
VO	venkovské oblasti
Výbor HRR	Výbor hospodářského a regionálního rozvoje
ZK	zastupitelstvo kraje
